Entrega Completa

Entrega Parcial

Labores de Movimiento de Tierra y Zanjas

TRACSMART 1PV				
Gabriela - Pitch 5,8m				
SYMBOL	TYPE	UNITS	MODULES	%
	Single row 1PV 2Str88 (56 Modules)	165	9.240	2.10%
	Single row 1PV 1Str88 (28 Modules)	10	280	0.06%
	Dual row 1PV 4Str88 (112 Modules)	3670	411.040	93.31%
	Dual row 1PV 2Str88 (56 Modules)	356	19.936	4.53%
TOTAL		4.201	440.496	100.00%

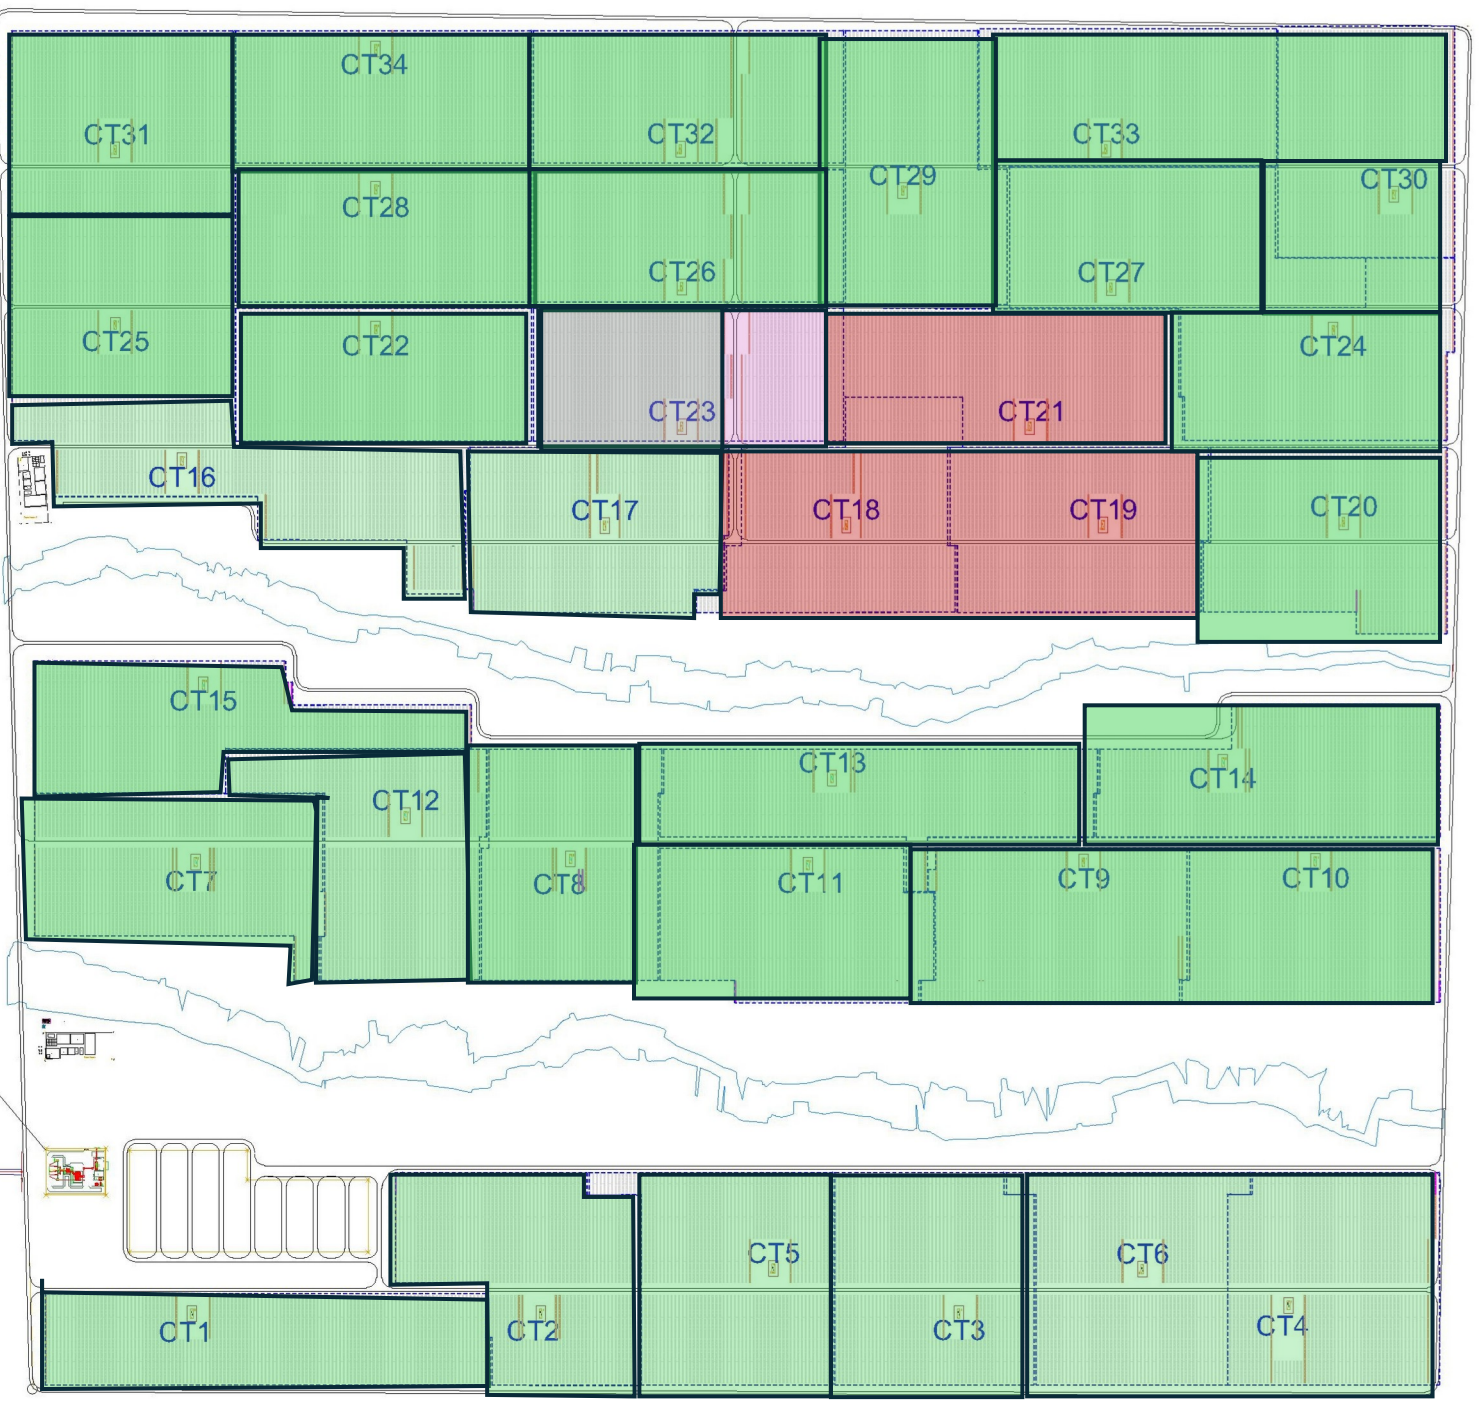

EL **CT 11** Este fue entregado para labores el día Lunes 13 de Octubre. **CT 18** según reunión del 16 de Octubre este se entregara para labores el 18 de octubre de todas formas se avanzo y tiene perforado, **CT 19** no se encuentras entregados ni liberados, pendiente proceso de apertura de zanjas, se procede a perforar para no detener el avance, se cuenta con sección hincada. Empresas de movimiento de tierra sacando material para relleno efectuaron corte en el área Sur del CT afectando esa zona con un corte de 2 mts de alto app. Ver Imagen **CT 21** tiene zanjas abiertas no se tiene

Labores de Zanjas para tendido de cables

- CT 19:
  - ✓ Pendiente apertura de zanjas para tendido de cables.
  - ✓ Empresas de movimiento de tierra sacando material para relleno efectuaron corte en el área Sur del CT afectando esa zona con un corte de 2 mts de alto app. Ver Imagen en siguiente Cuadro
- CT 23:
  - ✓ Zanjas abiertas en la sección Este del CT
- CT 18:
  - ✓ Zanjas abiertas y en proceso de cierre, se comprometen su entrega el 18 de octubre.
  - ✓ Se efectúa perforado y hincado en la zona norte que tiene sección con zanjas tapadas
- CT 21:
  - ✓ No se han iniciado las labores de zanjas para tendido de cables, se dejara al ultimo según lo conversado, este CT ya cuenta con perimetrales y relleno es una de sus secciones al Norte.

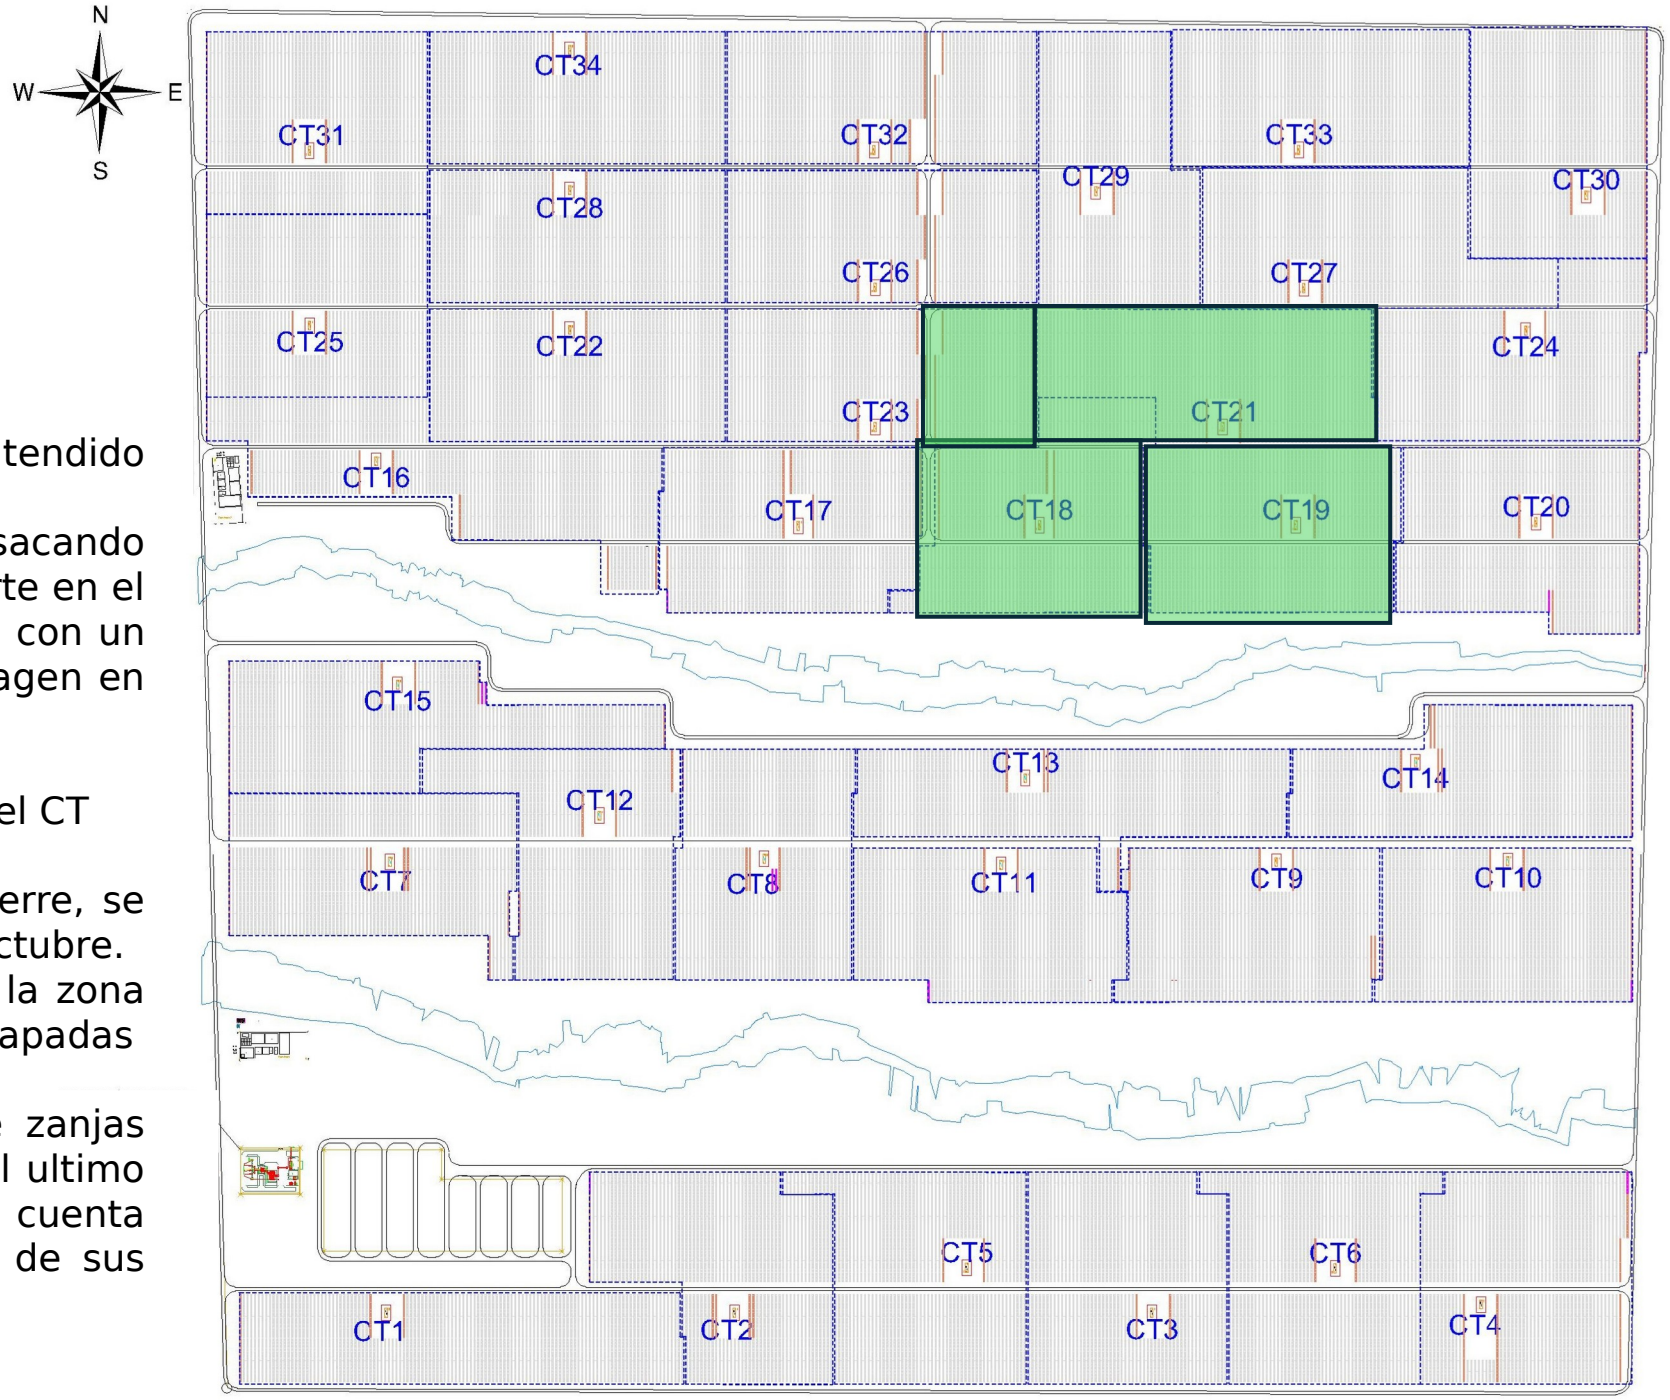

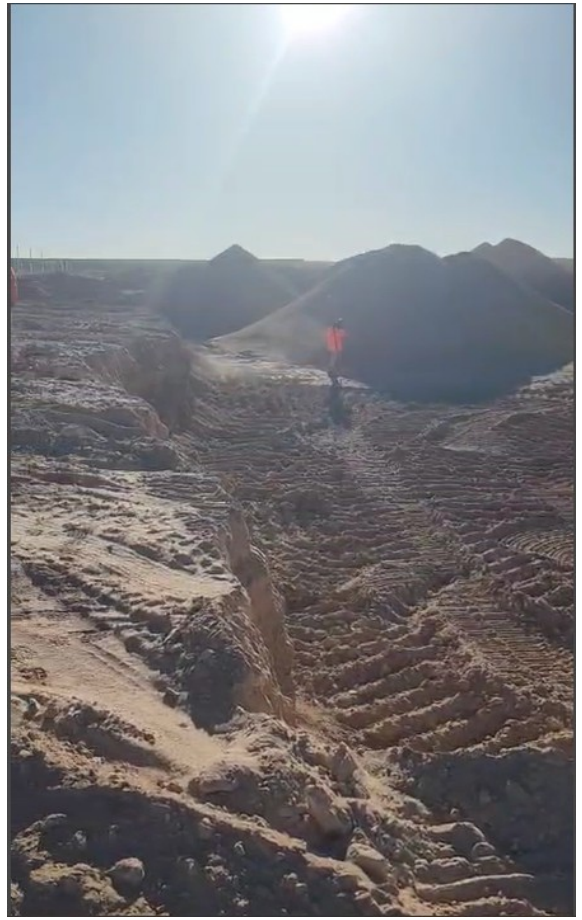

Sección Sur del CT 19: empresas en labores de extracción de tierra para cierre de zanjas eléctricas realizaron un corte que compromete el área destinada al hincado

CT 18: En el Paño 3 se observa material en los sectores este y oeste del CT, y en el Paño 4, material acopiado en el lado norte
